



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

## ДОГОВОР

№ 15437-126-0703/16.02.2015

За възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове

Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”
Номер на договор за БФП:	DIR-5113326-C-004
Наименование на проекта:	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”
Бенефициент:	ДПП СТРАНДЖА

Днес, 16.02. 2015 г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” , БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от инж.Владимир Димитров – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. «БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ» ЕООД , БУЛСТАТ 102833771, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул.„Ал.Богориди“ № 16, представлявано от Васил Танев- Управител, наричан/а/о по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.41, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение №124-ОПОСЗ./10.12.2014 г. на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове**

се сключи настоящият договор за следното:

*[Handwritten signature]*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moew.government.bg/>



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническа спецификация от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши **Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”** (наричани общо по-долу за краткост „Услуга/та”).

(2) Предоставянето на Услугата включва дейностите, описани в Приложение №1, като всяка от дейностите следва да включва мероприятията, посочени в приложението.

(3) Услугата следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящия Договор и приложенията към него, както и приложимото действащо законодателство.

## II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1) Сроктът за изпълнение на Услугата като цяло е 180 / сто и осемдесет/ дни, считано от датата на подписване на Договора.

(2) Място на изпълнение на Услугата е територията на Природен Парк „Странджа”.

## III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата стойност на Договора е в размер на **87 460.00 лв** / осемдесет и седем хиляди четиристотин и шестдесет лева/, без вкл. ДДС или **104 952.00 лв** / сто и четири хиляди деветстотин петдесет и два лева/ с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна.

(2) Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се извършва след подписване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателния приемо-предавателен протокол за изпълнението на всички дейности, включени в Услугата, в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на фактура за дължимата сума.

(3) Плащането се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка: „ОББ“ ЕАД – клон Бургас**  
**IBAN: BG70 UBBS 8002 1024 506014**  
**BIC : UBBS BGSF**

(4) Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



### **Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1) При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в Договора условия;

2) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия Договор.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да извършва услугата по Договора с дължимата професионална грижа и добросъвестност чрез надлежно квалифицирани специалисти;

2) Да изпълни услугата съгласно договорените срокове и условия и при спазване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3) Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Тези срокове се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт;

4) Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с Договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугата или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

5) Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1) При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в Договора условия;

2) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия Договор.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да извършва услугата по Договора с дължимата професионална грижа и добросъвестност чрез надлежно квалифицирани специалисти;

2) Да изпълни услугата съгласно договорените срокове и условия и при спазване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3) Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Тези срокове се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт;

4) Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с Договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугата или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

5) Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

задължение пред трети страни.

6) Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на ПРОЕКТА и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на ПРОЕКТА.

7) Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” [http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info\\_Publicity/Nasoki\\_Info-Publ\\_2011.pdf](http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf)).

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Да проверява изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно качество, срокове и др., без да пречи с действията си на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2) Да иска изпълнението на Услугата, възложена с Договора, в срок и по реда и при условията, договорени между страните;

3) Да откаже приемането на работата при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на Договора;

4) Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да заплати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията на Договора.

2) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

## **VI. ДОКЛАДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

Чл.8. (1) За удостоверяване изпълнението на всяка една от дейностите, включени в предмета на настоящия Договор, страните по него подписват съответен констативен





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

протокол.

(2) За удостоверяване изпълнението на всички дейности, включени в предмета на договора, страните подписват окончателен приемо-предавателен протокол.

(3) Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който последният ще посочи и който ще го представлява в хода на изпълнение на работите, предмет на договора и ще подписва всички протоколи.

(4) Протоколите се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При приемането на действително извършените работи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи или преработи за своя сметка като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнително Приемо-предавателен протокол.

## **VII. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.9 Настоящият договор се прекратява:

- 1) с изпълнение предмета на договора;
- 2) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;
- 3) при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

Чл.10 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

- 1) при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- 2) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
- 3) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение за извършената и приета до момента на прекратяване на договора работа с изключение на случаите по чл.5, т.3, б. "б" от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

## **VIII. САНКЦИИ**

Чл. 11. (1) В случаите на виновно забавено изпълнение или друг вид неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от цената на забавената работа по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % ( десет процента).

(2) В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % ( десет





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

процента).

Чл. 12. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

Чл. 13. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този Договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

Чл. 15. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 17. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия, са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 18. (1) По смисъла на договора, непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато обстоятелството по ал. 1, е настъпило вследствие на неположена грижа или ако при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

(3) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

## X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

Чл. 20. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. (1). При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

гаранцията за изпълнение на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

## XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.

Чл. 23. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Данни ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Дирекция на природен  
парк "Странджа"

Адрес: град Малко Търново,  
ул. Янко Маслинков №1  
БУЛСТАТ: 102664798  
Тел./Факс: 05952/36 35

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Бургасцвет-90-Танев“ ЕООД

Адрес: гр.Бургас  
ул. "Ал.Богориди" № 16  
ЕИК: 102833771  
Тел. 056/841660  
Факс: 056/841688

(2) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 7 /седем/ дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Ръководителят на Екипа за управление на Проекта.

Чл. 24. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 25. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения.

(2) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Чл.26. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moew.government.bg/>



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

— два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение;
4. Приложение № 4 – Гаранция за добро изпълнение;
5. Приложение № 5 – Свидетелство за съдимост на управляващия и представляващ изпълнителя;
6. Приложение № 6 – Удостоверение за липса на задължения към държавата;
7. Приложение № 7 – Удостоверение за липса на задължения към общината.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

.....  
**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН  
ПАРК „СТРАНДЖА”**

.....  
**СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**



**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

.....  
**Васил Танев-Управител**




.....





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

*III В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.*

## РАЗДЕЛ VII.

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на ДПП Странджа, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004/2012 г., проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година.

**1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:** „Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове”

#### **2. ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ:**


##### **3.1.: Район на проекта:**

Необходимо е да се извърши пряко унищожаване на дървесни и храстови инвазивни растения от видовете айлант и аморфа в пилотни райони по поречията на река Велека и нейните притоци, в следните поземлени имоти и подотдели от Държавни горски територии, с обща площ 71 дка. В иглолистните култури инвазивният вид храстовидна аморфа (*Amorpha fruticosa*) е залесена през 50-те години на миналия век по горските схеми за създаване на горски култури с главен дървесен вид, второстепенен вид и храсти.





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- 3.1.1. Подотдел № 150 "и" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година - горска култура от иглолистни видове с подлес от аморфа – 5 дка;
- 3.1.2. Подотдел № 155 "з" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – горска култура от черен бор с подлес от аморфа – 8 дка;
- 3.1.3. Подотдел № 156 "в" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – горска култура от иглолистни видове с подлес от аморфа – 8 дка;
- 3.1.4. Подотдел № 156 "д" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година горска култура от черен бор с подлес аморфа - 27 дка;
- 3.1.5. Подотдел № 163 "к" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – дъбово издънково насаждение с подлес от аморфа – 5 дка – част от подотдела по брега на реката;
- 3.1.6. Подотдел № 169 "1" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година - поляна, покрита с аморфа – 9 дка.
- 3.1.7. ПИ № 1004, землище на с. Звездец, м. Ковач – поляна, покрита с айлант 9 дка;

**3.2. Методология на изпълнение:**

Възстановяването на увредени местообитания по поречията на големите реки в Парка изисква да се осъществят следните мероприятия:

1. Изкореняване и механизизирано или ръчно почистване на сечищата от дървесина, пънове, дървесни и храстови отпадъци в подотдели № № 150 "и", 163 "к", 169 "1" и ПИ № 1004.

В подотдел № 150 "и" иглолистната група от бял бор и кедри да се запази. Под склопа да се отсеке и почисти аморфата и се извърши ръчна подготовка и залесяване.


В подотдел № 163 "к" ще се изкорени заетата с аморфа крайбрежна част.

2. Пълна обработка на почвата на изкоренените площи на дълбочина до 50 см. В отделни участъци, където не е възможно механизизирано, подготовката на почвата и изкопаването на дупки да се извършат ръчно.





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3. В подотдели № № 153 "з", 156 "в" и 156 "д" ще се изсече аморфата и други храсти под склопа и отпадъците ще се изнесат извън насаждението. Ще се извърши ръчна почвоподготовка в междуредията и свободни пространства.
4. Възстановяване на местообитанията чрез залесяване с местни растителни видове.

Дървесните отпадъци, клони и храсти от инвазивни видове да бъдат струпани на купчини и унищожени чрез изгаряне, там където се извършва изкореняване и пълна обработка на почвата (подотдели № № 150 "и", 163 "к", 169 "л" и ПИ № 1004.).

Почистените от инвазивни видове площи да бъдат залесени с фиданки от местни дървесни и храстови видове в смесени съобщества (бяла върба, дъбове, дребнолистна и сребролистна липа, обикновена леска, горскоплодни и др.) – в различни схеми по предварително изготвен (от Изпълнителя) и одобрен технологичен план за залесяване (съгласуван от Възложителя), съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване.


Залесяването с местни растителни видове да се осъществи чрез следните мероприятия:

5. Доставка на пикирани и семеннишни фиданки с височина не по-малка от 0,40 м и не по-високи от 1,20 м, от сребролистна липа, дребнолистна липа, обикновена леска, дъбове и резници от бяла върба и др., достатъчни на брой за уплътняване на площите с не по-малко от 250 фиданки на декар, съобразени с условията на месторастенето.
6. Подготовката на почвата за залесяване и отварянето на дупки, механизирано (с моторен свредел) и ръчно да се извърши съгласно одобрен технологичен план.
7. Засаждане в дупките на фиданки от гореизброените видове, с височина не по-малка от 40 см.
8. Последващи грижи за залесените площи (окопаване, окосяване, изсичане на издънки, мулчиране, поливане и др.), съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване.
9. Изпълнителят се задължава процентът на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 % след извършена инвентаризация на горските култури до 15.08.2015 година.





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестиране във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

9. Изработка и монтаж на 7 броя дървени табели, поставени във всеки експериментален участък (отдел, подраздел), направени по стандарт на Парковата инфраструктура. Всяка табела ще съдържа информация за извършената дейност. Текста на табелите ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя. Размер на табелите – 60 x 90 см.

**Продължителност:** Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.08.2015 г.

**Допълнителни препоръки и изисквания:**

Изпълнителят да разполага с необходимата техника, екипировка и човешки ресурс за извършване на дейността.

Изпълнителят се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със Закона за горите и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП (ЛУП), и актуална скица на ПИ № 1004, м. Ковач, земл. на с. Звездец, издадена от Общинска служба "Земеделие" – Малко Търново, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

Извършените допълнителни разходи за държавни такси, одобрения и др. са за сметка на Изпълнителя.

**При извършване на дейността да се спазват:**

1. Закон за защитените територии.
2. Закон за горите.
3. Наредба № 2 от 07.02.2013 година, за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използване за създаване на специални, защитни, и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.
4. Закон за биологичното разнообразие.
5. Нормативната уредба по отношение безопасните условия на труда.

*Handwritten signature*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**  
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец № 12

До

ДПП „СТРАНДЖА”

гр. МАЛКО ТЪРНОВО

ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа” - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата Васил Вълков Танев, в качеството ми на Управител (посочете длъжността) на „Бургасцвет-90-Танев“ ЕООД (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК102833771 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“ № 16 съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за представявания от мен участник, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме да изпълним поръчката в срок от 180 (календарни дни) считано от датата на подписване на договора.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."

Съгласен съм





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

**1. Обосновка за изпълнение на поръчката;**

**УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;
- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Управлението на риска е непрекъснат процес, който е неразделна част от управленския процес. Инструментите и уменията, нужни за въвеждане на процеса по управление на риска и за получаване на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати, трябва да се изберат в съответствие с рисковете и при оптимално разходване на средства. Ние ще разработим Стратегия за управление на риска и ще въведем система за контрол и докладване (вътрешно и външно) на значимите рискове на съответните нива.

**Основни правила при разработване на стратегия за управление на риска са:**





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще




НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

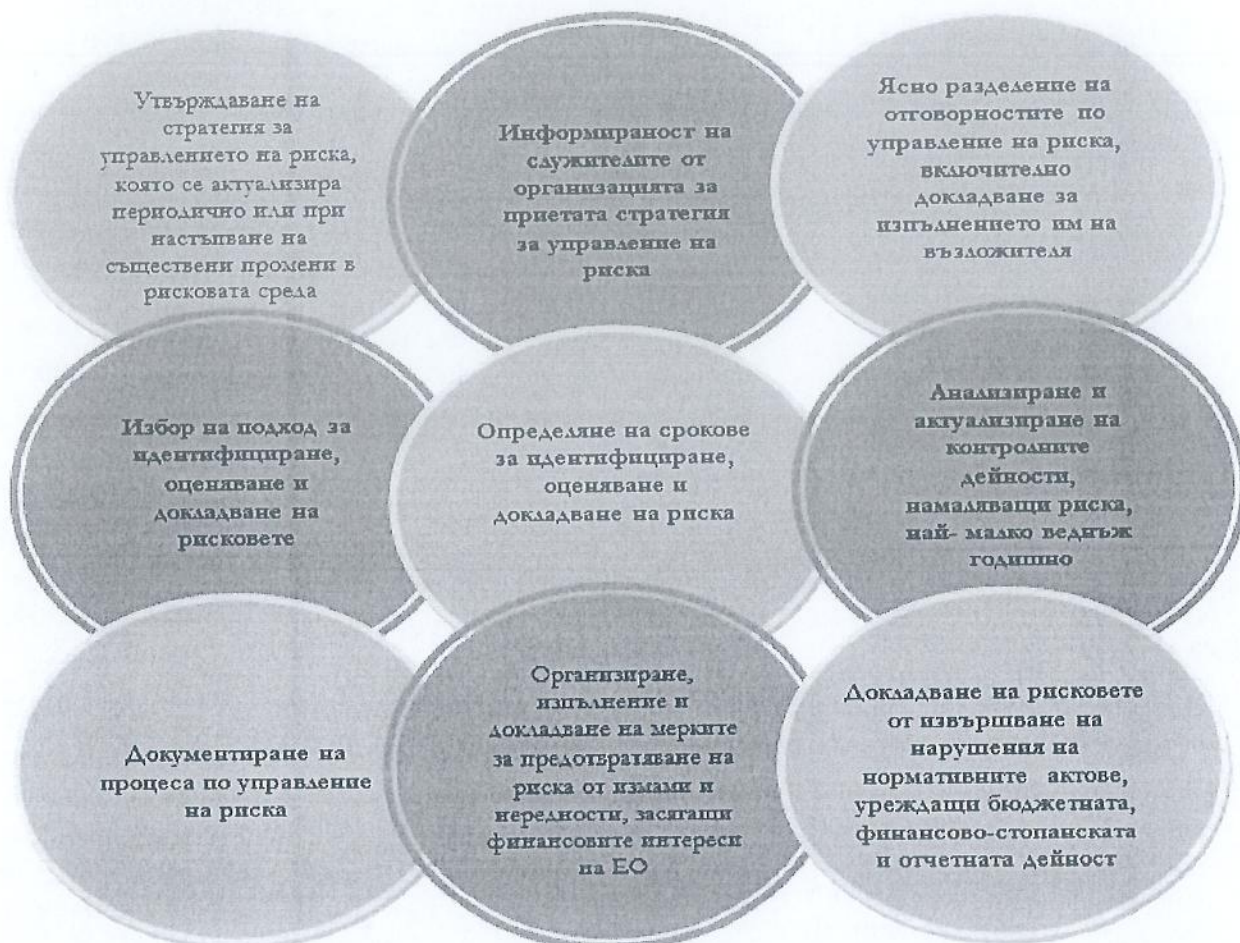

При осъществяването на подобен обект се очертават редица чувствителни въпроси които могат да се идентифицират като рискови за успешното изпълнение на проекта.

Реализиране на риска, под каквато и да е форма, е свързано с неблагоприятни последици за Възложителя. Като сборно понятие за обозначение на цялата съвкупност от отрицателни явления може да се използва понятието ВРЕДА. Тя отразява разликата в стопанското състояние на парка преди и след реализиране на риска. Вредата е равна на негативно отклонение на резултата от поставените цели. Ръководството на Дружеството ще заложи поставените цели от Възложителя така, че управлението на риска да е регламентиран процес на въздействие. Протичането на този процес ще се съпровожда с различни изменения, които настъпват както със средата на действие на управляващата част, така и на управляваната част. По този начин ще се създават условия за изменение в характера на въздействията и реакцията на изпълнителите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

3





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

*[Handwritten signature]*

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Предвиждането на тези изменения е свързано със съответна степен на елиминиране на съществуващата неопределеност в поставената среда. Изработване на решения от управляващата част в условие на действие в средата на неопределеност се съпътства с определена доза риск. За елиминиране на риска е необходимо създаване на подходящи условия на промени в неопределената среда. За тази цел последните трябва да се характеризират в конкретен план.

По-важни са събития със случаен характер, които трябва да бъдат неутрализирани с логични решения, като: недостатъчна степен на познаване на структурата на средата, невъзможност да се влияе върху определени параметри на поведението на средата, голямо многообразие на вариантите на поведение на елементите на средата. За да се постигнат набелязаните цели управляваната част също трябва да се съобрази със състоянието на неопределеност на средата. До голяма степен неопределеността и управляваната част е обособена. За елиминиране на неопределеността е необходимо да се изгради система за ранна диагностика, която да може да елиминира факторите на неопределеност.

От практическа гледна точка управлението на риска може да се дефинира като процес на планиране, организация, регулиране, и контрол на дейностите по реализация на инвестиционните проекти. На управлението на риска съответства една част от тази дефиниция, минимизирането на неблагоприятните резултати, които събития оказват влияние върху процеса на изпълнение.

Както общото управление така и управлението на риска предполага вземане на решения с цел постигане на определените цели. Логическата процедура за вземане на решение в общото управление и управление на риска включва идентификация и анализ на проблема; формулиране на алтернативни решения на проблема; избор на най-добро решение; осъществяване на избрана алтернатива и проверка на резултатите за адекватност и изменения на условията. Всичко това участникът в настоящата процедура ще изготви като анализ.

Параметри, на базата на които управленските решения ще трябва да бъдат взимани по време на реализация на проекта:

- Информирание - поведението на всеки от участниците в реализацията на проекта зависи от степента на ориентиране за средата, в която работи, както и на познаването ѝ. Липсата на информация често пъти води до забавяне на реакцията по отношение на средата. От гледна точка на тази функция управлението на риска изисква да се осигури достатъчно информация на всички изпълнители. Това на практика намаля неопределеността. Основната мярка за това е редовните срещи между всички участници в проектите.

- Целеполагане - всяка цел, поставена на база необходима информация намалява риска.

- Организиране - целите могат да се окажат само идеален вариант при изпълнението на проектите и поведение за елиминиране на външната неопределеност. В крайна сметка управлението на риска се материализира в конкретни действия, засягащи парка и ефективното използване на ресурси и хора.

*[Handwritten signatures and initials]*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



*[Handwritten signature]*

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

-Контрол и регулиране – без оценка на състоянието и поведението на изпълнителите на инвестиционните проекти, не би могло да се оцени доколко се изпълняват конкретните цели и дали в процеса на тяхното постигане се налага корекция. Във връзка с това контролно - регулиращата функция дава информация за степента на преодоляване на неопределеността на външната среда, т.е степента на елиминиране на риска.

Рискът е основен фактор в управлението на проекта. Необходимо е да има ангажимент и от възложителя, и от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на проекта. Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията му, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление на риска.

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Предлагаме качествен анализ и оценка на риска, чрез създаване на риск регистър и матрица на рисковете. Тези инструменти се прилагат с цел да се идентифицират и оценят и двете възможности – положителните и отрицателните последствия от рисковото събитие.

#### Процес на управление на риска

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др. Тези процеси са следните:

- ✓ определяне на факторите на влияние – анализ и оценка на тези фактори, които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;
- ✓ идентифициране на риска – определяне и документиране на онзи променлив, характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;
- ✓ качествен анализ на риска – определяне на вероятния начин на промяна на идентифицираните рискови променливи;

5  
*[Handwritten signatures]*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

✓ количествен анализ на риска – задаване на количествени стойности на извършения качествен анализ;

✓ оценка на риска – извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет – тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;

✓ свързано с изчислената ефективност на проекта – конкретен количествен измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове ефективност – социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители.

#### Методика за качествен анализ на риска

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията чрез съответни методи и инструменти. Методиката, предложена в настоящото изследване, се състои от следните стъпки:

- ✓ Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)
- ✓ Оценка на значимостта на риска
- ✓ Оценка на вероятността от настъпване на риска
- ✓ Съставяне на матрица на рисковете.

#### Определяне на рисковете и категоризацията им

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска.

При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта. Съответните категории рискове могат да бъдат: рискове на проектирането и планирането (напр. промяна на проекта, изисквана от възложителя); рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); рискове за приходите (промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, промени в цените); рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на възложителя); технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна) и т.н.

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

#### Оценка на значимостта на рисковете

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи.

За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите.

Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.

#### Оценка на вероятността от настъпване на риска

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването му. Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и прозрачен начин не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобни проекти. Затова допусканите параметри и процедурите, които ще се следват при оценяване на възможностите, трябва да бъдат логични и добре документирани. Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на вероятността от настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен).

Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска.

#### Матрица на риска

Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете по отношение на вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на рисковете се съставят диапазони, формулирани на няколко нива, чрез индекс на риска. Възможно е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните рискове или за първите да се аранжира по-нисък клас индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение с неблагоприятните рискове.

На база създадената матрица на рисковете всеки участник дава оценка на съответния риск, след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се класират приоритетните рискове.

Възложителят е дефинирал някои рискове, които могат да възникнат при изпълнението на Договора и биха могли да имат евентуален отрицателен ефект върху изпълнението му. Нашият подход е да се признаят тези рискове и да работим в





Решения за  
по добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

партньорство с парка и ключови заинтересовани страни за намаляване на риска, доколкото е възможно.

В следващата таблица е нашето разбиране по отношение на вероятността от поява и тежестта на описаните рискови въздействия. Нашето тълкуване за мащаба на въздействието им върху проекта е "ниско, средно и високо".

Риск №	РИСКОВЕ	Вероятност от поява	Сила на въздействие
1	Времеви рискове : - невъзможност за своевременно извършване на почвоподготовката, ако не се осъществи в срок изсичането и изкореняването на аморфата и айланта. - изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите - неблагоприятни метеорологични условия, пречателни за извършването на горскостопанските мероприятия, качествено и/или в срок.	Средна	Средна
2	Невъзможност за постигане на необходимото качество в резултат липсата на подходящ и качествен посадъчен материал.	Средна	Висока
3	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услугите	Средна	Висока
4	Промени в законодателството на България или на ЕС: промени в изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.	Средна	Средна
5	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от	Ниска	Висока





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Риск №	РИСКОВЕ	Вероятност от поява	Сила на въздействие
	страна на Възложителя.		
6	Забавяне при съгласуване на технологичния план.	Средна	Средна

Това е общия подход на Изпълнителя към рисковете, които могат да имат отрицателен ефект върху изпълнението на проекта, имайки предвид значимостта на този проект, наличието на различни дейности, изпълнявани за достатъчно дълъг период от време. Този подход дава възможност за ефективно планиране на ресурсите и дейностите, с цел да предотвратят потенциални смущения и намаляване техните ефекти, така че проектът да може да се управлява с максимална ефективност и се постигне първоначалното предназначение.

**РИСК 1. Времеви рискове :**

- ✦ невъзможност за своевременно извършване на почвоподготовката, ако не се осъществи в срок изсичането и изкореняването на аморфата и айланта.
- ✦ изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
- ✦ неблагоприятни метеорологични условия, пречателстващи извършването на горскостопанските мероприятия, качествено и/или в срок.

Невъзможност за своевременно извършване на почвоподготовката, ако не се осъществи в срок изсичането и изкореняването на аморфата и айланта.

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка.

Основна изходна точка при анализа на риска ще бъде началната информация, с която ние разполагаме. Това ще ни даде възможност за изготвяне на коректна технологична програма и план. Нашата задача като Изпълнители е да осигурим необходимата техника, материали и човешки ресурси за започване на дейностите, предвидени в проекта. От съществено значение е също така запознаването с проектната документация и съставяне на различни схеми по предварително изготвен (от Изпълнителя) и одобрен технологичен план за залесяване (съгласуван от Възложителя), съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване.

Започването на дейностите е тясно свързано с координиране дейността по провеждане осъществяване на инвеститорски надзор от Възложителя. От съществено значение е началото на дейностите, като трябва да отбележим и риска от неподходящи климатични условия.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Невъзможността за своевременно извършване на почвopодготовката, ако не се осъществи в срок изсичането и изкореняването на аморфата и айланта, съгласно посочената по-горе таблица, е със средна тежест и ниво на риска, тъй като могат да бъдат взети мерки впоследствие за преодоляването му. Част от тези мерки според нашето виждане са:

- актуализиране на графика за изпълнение на дейностите, свързани с методологията на изпълнение на поръчката.

- насищане на обекта с допълнителни ръководители, работници, механизация и други.

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

За недопускане/предотвратяване на риска ние ще вземем следните мерки:

- получаване от Възложителя възможно най-пълна и точна начална информация относно пълнота на проекта.

- допълнително възникнали изисквания на Възложителя.

- изготвяне на коректен технологичен план.

- оказване съдействие на Възложителя при съставяне на документацията, съпътстваща проекта.

- съобразяване началото на дейностите съгласно метеорологичните прогнози

- Мерки за преодоляване на риска

За преодоляване на въздействието на риска върху започването на дейностите ние ще предприемем съответните действия.

Според нашето виждане те са:

- Насищане на обекта с допълнителни ръководители, работници, механизация и други.

- Промяна в работното време съгласно допустимите граници в кодекса на труда.

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

Нашият екип има опит в работата като Изпълнител на подобни обекти на територията на ДГС Звездец, Община Поморие, Царево. Имаме изграден офис на територията на с. Звездец с техническа база. От опит знаем, че може да се появи закъснение в графика по време на изпълнението на договора. В изпълнението на конкретният обект изложени на риск са следните дейности:

- Земни работи /изкореняване и избутване на пъни, подравняване, риголване, подравняване след риголване, почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване/.

- Залесяване.

- Последваща грижа за залесените площи.

- Изработка и монтаж на табели.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Следващата ни стъпка е идентифициране на опасностите и оценка на риска, а именно:

- вероятност от поява и сила на въздействие
- Изоставане от графика на изпълнение на работите съгласно посочената по-горе таблица е със средна тежест и ниво на риска, тъй като могат да бъдат взети мерки за преодоляването му.

• Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

С цел да се намали ефекта на тези нежелани реакции ние предлагаме ранно одобрение на общия график и одобрен технологичен план за залесяване за изпълнението на проекта. Нашият екип за управление на проекта стриктно ще наблюдава изпълнението на установените срокове и евентуални закъснения и пропуски ще бъдат навреме идентифицирани и управлявани.

• Мерки за преодоляване на риска

За преодоляване на въздействието на риска върху изоставането от графика за изпълнение на дейностите ние ще предприемем съответните действия:

- Изготвяне на актуализиран график
- По време на изпълнение на земните и залесителни дейности ние ще се създадем ефикасна и функционална комуникация, контрол и механизми за превенция, което ще позволява бързо и ефективно подобряване на работата съгласно изготвения актуализиран календарен график, който ще съгласуваме с Възложителя и всички заинтересувани страни по проекта.

- Промяна в работното време съгласно допустимите граници в кодекса на труда.

Неблагоприятни метеорологични условия, пречателни извършването на горскостопанските мероприятия, качествено и/или в срок

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

Натрупания опит в изпълнението подобни обекти показва, че се очертават редица чувствителни въпроси, които могат да се идентифицират, като рискови за успешното приключване на обекта:

- Промени в проектите по време на изпълнението
- Некоректни действия и/или бездействие от страна от Възложителя водещо до забавяне в одобрението на изготвяните документи/ пример: технологичен план за залесяване и др./

- Промени в предварителните условия на проекта по време на изпълнението му.
- Допускане на нередности в управлението и изпълнението на проекта.

Тук бихме искали да посочим и следните обстоятелства:

- Забавяне поради изключително неблагоприятни метеорологични условия през периода на дейностите описани по-горе.

- Появата на "непреодолима сила", т.е. непредвидимо, форсмажорно и непреодолимо климатично събитие от извънреден характер /свлачища в резултат на наводнения, преляли водни басейни и др./.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Въпреки че според оценката на рисковете, те имат голямо въздействие върху резултатите от проекта, нашият екип, съгласно опита си в изпълнението на други такива обекти на територията на ДГС Звездец, Община Поморие, Царево, където е изпитал подобен вид проблеми, смята, че ще съумее да доведе по спокоен начин до изпълнението на дейностите, в тясна връзка с Възложителя и в съответствие с подписания договор за работа.

Ние като Изпълнители ще наблюдаваме и докладваме за всички пречки, забелязани в процеса на работата в резултат на метеорологични условия и гарантираме, че персоналът ще работи активно и професионално за намаляване на рисковете от забава на проекта и облекчаване на този проблем.

Неблагоприятни метеорологични условия, пречателстващи извършването на горскостопанските мероприятия, качествено и/или в срок, съгласно посочената по-горе таблица е със средна тежест и ниво на риска.

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

За недопускане/предотвратяване на настъпването на риска нашия екип ще предприеме следните действия:

- Провеждане на по-интензивни консултации при установени пречки, дължащи се на метеорологични забави;

- Обявяване и открито дискутиране на всички възникнали проблеми в резултат на метеорологичните условия, както от страна на Възложителя така и от страна на Изпълнителя;

- Добро и навременно планиране, добра връзка и комуникация с Възложителя;
- Навременно изготвяне на отчетни документи;

- Мерки за преодоляване на риска

За преодоляване въздействието на неблагоприятни метеорологични условия върху закъснението за окончателно приключване на изпълнение на дейностите и предаване на обекта ние ще предприемем съответните действия, като:

- При промени в проектите ще създадем допълнителна организация, работници и механизация за навременното изпълнение на промените в резултат на метеорологичните условия (съществени или несъществени). При настъпили промени в предварителните условия за изпълнение на проекта ще направим всичко възможно за изпълнението им и сведем до минимум влиянието им върху времетраенето на обекта.

- Опитът ни ще ни позволи да сведем до минимум некоректни действия и/или бездействие от страна на всички заинтересовани страни и недопускането на нередности в управлението и изпълнението на проекта.

- За да намалим последствията от неблагоприятни метеорологични условия ние ще сключим договор (абонамент) с метеорологичен център за ранно предупреждение при възникването на форсмажорни обстоятелства. Това ще ни позволи да евакуираме предварително хора, материали, механизация и др.

**РИСК 2. Невъзможност за постигане на необходимото качество в резултат липсата на подходящ и качествен посадъчен материал.**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за

по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

Изпълнителят има за задача да извърши всички видове дейностите до завършване и предаване на обекта. От съществено влияние е риска липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на Възложителя. От това произтичат следните трудности според нас при изпълнението на проекта, имайки предвид неговата специфика, а именно:

- Непълноти или неточности в проектната документация, отнасящи се до технологичен план за залесяване;

- Лоши метеорологични условия, в резултат на които има липсата на подходящ и качествен посадъчен материал;

- Ненавременното изготвяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване.

- Ненавременното осигуряване на достъп;

Невъзможност за постигане на необходимото качество в резултат липсата на подходящ и качествен посадъчен материал, съгласно посочената по-горе таблица е със средна тежест на вероятност от поява и висока сила на въздействие на риска.

• Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

За недопускане/предотвратяване на настъпването на риска нашият екип ще предприеме следните действия:

- Установяване на добър и конструктивен диалог и комуникации с Възложителя и всички заинтересовани страни.

- Ще работим за осигуряване на необходимата подкрепа, ангажимент и участие на Възложителя в процеса.

- Притежаваме собствени разсадници, където вече имаме отгледани, в наличност подходящите видове и бройки, необходими за изпълнението на залесителните мероприятия.

• Мерки за преодоляване на риска

За преодоляване на въздействието на риска върху закъснението за окончателно приключване за изпълнение на дейностите и предаване на обекта ние ще предприемем следните действия:

- Осигуряване на допълнителни ресурси за изпълнение на коригираните неточности и непълноти в проекта: наемане на допълнително специалисти и специализирана техника за доставяне и залесяване на качествен материал.

- Своевременно ще информираме Възложителя от необходимостта ни за достъп при изпълнение на дейностите.

- Абонамент за метеорологичен център за ранно предупреждение при възникването на форсмажорни обстоятелства.

**РИСК 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на**





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2.06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", Бенефициентът по Програмата и Възложител на договора за дейностите.**

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

- Ефективността на сътрудничеството на заинтересованите страни е основна предпоставка за успеха на проекта. Ще положим усилия да работим в най- тясно сътрудничество с управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", Бенефициента по Програмата и Възложителя на договора.

Нашият изпълнителски екип ще помогне на Възложителя за намиране на подходящи решения за изпълнение на проекта, като се спазват разпоредбите на българското национално законодателство.

Натрупаният опит в изпълнението подобни обекти на територията на ДГС Звездец, Община Поморие, Царево показва, че се очертават редица чувствителни въпроси, които могат да се идентифицират като рискови за успешното приключване на обекта:

- Процедиране на възникнали непредвидени дейности/промяна на дейности по изпълнението на дейностите от Възложителя и УО на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".

- Забава одобрение от страна на Възложителя на материалите и документите изработени от Изпълнителя/ технологичен план за залесяване/.

- Недостатъчна ефективност в комуникацията между Възложителя и Изпълнителя при разглеждане и одобряване на документи.

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Бенефициентът по Програмата и Възложител на договора за дейностите, съгласно посочената по-горе таблица е със средна тежест на вероятност от поява и висока сила на въздействие на риска.

• Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.


Ние бихме желали още на началната среща след подписване на Договора да се определят ясни и конкретни задачи за всички заинтересовани страни, с граници на установяване отговорност и спазване на задълженията, на отношения на сътрудничество и взаимна информираност за предотвратяване на несъответствия. Решения за въздействие върху изпълнението на дейностите с информирано съгласие на всички участващи страни.

- Отлично и ефективно сътрудничество и взаимодействие между страните участващи в проекта.

- Добра работа и тясна комуникация с наблюдаващите проекта от страна на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.".

• Мерки за преодоляване на риска





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



*[Handwritten signature]*

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

За преодоляване на въздействието на риска ние предлагаме следните действия:

- Провеждането на по-интензивни консултации между всички участници в проекта;
- Създаване на атмосфера на откритост и доверие;
- Пълно съдействие на Възложителя при идентифициране на източниците на информация, изготвяне на необходимите писма, становища, одобрения и др.;
- Съгласуване между всички заинтересовани страни по проекта възможните алтернативи за преодоляване последиците от риска.;
- Координация при реализацията на решенията.;
- Контрол при изпълнението на решението.;

**РИСК 4. Промени в законодателството на България или на ЕС: промени в изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.**

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

- От съществено влияние е рискът промени в законодателството на България или на ЕС: промени в изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на възложените дейности за залесяване да спазва българското, както и приложимото в момента европейско законодателство.

От съществено значение също така е познаване и спазване изискванията на ОПОС за наблюдението и отчитане изпълнението на договора с Възложителя. При евентуални промени в нормативните уредби по време на изпълнение на проекта или кратко време от приемането и действието на съответните разпоредби произтичат съответните рискове.

Тези промени в българското или европейското законодателство биха се отразили негативно на отчетността, регламентирана при изпълнение на договора във времетраенето му и биха довели до съответни допълнителни разходи.

Промени в законодателството на България или на ЕС: промени в изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента, съгласно посочената по-горе таблица е със средна тежест на вероятност от поява и средна сила на въздействие на риска.

• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска в приложимите случаи.

За недопускане/предотвратяване на настъпването на риска нашият екип ще предприеме следните действия:

*[Handwritten signatures]*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### **Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- създаване на група в рамките на организацията, която да следи за възможни изменения в изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."

- законодателството в страната и на ЕС, насочено към предотвратяване степента на риска от неочаквани промени, които да създадат пречки при изпълнението на проекта.

- доброто и навременно планиране и изпълнение на дейности съгласно одобрената проектна документация.

- добрата връзка и комуникация между Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Възложителя и Проектанта/Изпълнителя/.

#### **• Мерки за преодоляване на риска**

Нашето дружество притежава богат опит в работата по съответствие на процедурите и инвестиционните пакети на Европейската комисия. Нашият екип ще създаде точна и ясна оценка на субординацията на различните стратегически и нормативни документи и методология, която да позволи оценка на база аналогия, експертна оценка за последиците от едно или друго действие.

Изготвяне анализ на ситуацията и създаване на стратегия за привличане на заинтересованите страни, включително схемата за консултации за преодоляване последиците от риска.

### ***РИСК 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя***

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

Със съществено влияние е рискът неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя. От голямо значение са действията му по управление на останалите договори за изпълнение на проекта, сформирание на компетентен и отговорен екип за управление на проекта. Това би гарантирало изпълненията на задълженията на Възложителя съгласно договора и нормативните уредби на България и ЕС. От наша страна ние ще се постареем да осигурим необходимите финансови ресурси за извършване на дейностите. В тази насока имайки в предвид участниците в изпълнение на договора ние идентифицираме следните чувствителни въпроси, които могат да бъдат рискови за успешното приключване на обекта:

- Неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя на дейности, изразяващи се в спазване на графика, качествено изпълнение, поддържане на финансов ресурс.

- Неизпълнение на договорните задължения от страна на Възложителя, изразяващи се в липса или прекалено забавяне на необходимата информация, забавяне одобрение на материалите и документите изработени от Изпълнителя.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Неизпълнение на договорните задължения от трета страна, забавяне на административни процедури, неизпълнение на договора от страна на Възложителя както и задълженията на Изпълнителя.

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавяне на плащанията по договора от страна на Възложителя, съгласно посочената по-горе таблица е с ниска тежест на вероятност от поява и висока сила на въздействие на риска.

• Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

Нашият екип предлага следните мерки за предотвратяване на риска:

- Запознаване на Възложителя с развитие на работата и очаквани резултати.

- Изпълнение и предаване на обекта съгласно нормативните изисквания и в съответствие с проектната документация.

- Влагане на качествени материали, одобрени от Възложителя

• Мерки за преодоляване на риска

За забавата на плащанията по договора мерките са в ръцете на Възложителя. Ние като Изпълнител ще се постареем да смекчим негативното влияние, което събдването на такъв риск може да има върху изпълнение на работната програма на договора за дейностите, като предлагаме подходящо раз местване/промени в програмата с оглед новите обстоятелства.

От своя страна ние като Изпълнители ще си заделим резервен фонд, ще осигурим кредитна линия ако е необходимо, а също така ще застраховаме изпълнението на дейности по договора.

**РИСК 6. Забавяне при съгласуване на технологичния план.**

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка

Нашият екип има опит в работата като Изпълнител на подобни обекти. В изпълнението на конкретната процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004 има изложени на риск, породени от спецификата му, следните дейности:

- Земни работи /изкореняване и избустване на пъни, подравняване, риголване, подравняване след риголване, почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване/.

- Залесяване.

- Последваща грижа за залесените площи.

- Изработка и монтаж на табели.

Също така риск за забавяне при съгласуване на технологичния план, изразяващи се според нас в следното:

- Пропуски в изготвянето на документацията за кандидатстване.

- Необходимост от промяна на проектите по време на изпълнение на дейността.

- Нужда от допроектиране.

- Изготвяне на допълнителни детайли, касаещи изпълнението на дейностите.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Процедирание и одобрение на новите проекти
- Пропуски и непълноти в КСС.
- Възникнали непредвидени и допълнителни видове дейности.

Следващата ни стъпка е идентифициране на опасностите и оценка на риска, а именно:

вероятност от поява и сила на въздействие.

Рисковете при забавяне при съгласуване на технологичния план, съгласно посочената по-горе таблица, са със средна тежест на вероятност от поява и средна сила на въздействие на риска.

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи.

За недопускане/ предотвратяване на риска на горепосочените рискови фактори ние ще предприемем следните мерки:

- Подобен оглед на обекта.
- Навременна заявка и доставката на материалите.
- Подробно и задълбочено разглеждане и запознаване с проекта и проектната документация.

- Своевременно уведомяване на Възложителя с установените от нас пропуски и неточности.

- Мерки за преодоляване на риска

За преодоляване на въздействието на риска, породен от спецификата му и / или непълнота и/или неточности в проектната документация, ние ще предприемем съответните действия.

- Изготвяне на актуализиран график.
- По време на изпълнение на дейностите, ние ще се създадем ефикасна и функционална комуникация, контрол и механизми за превенция, което ще позволява бързо и ефективно подобряване на работата съгласно изготвения актуализиран календарен график, който ще съгласуваме с Възложителя по проекта.

- Промяна в работното време съгласно допустимите граници в кодекса на труда.

Ръководството осигурява и отговаря за разпространението и обмена на информация в организацията при осъществяване въздействие върху изпълнението при възникването на риска. По този начин се стимулират постоянното подобряване на качествено управление на възникналия риск.

## **2. Стратегия за изпълнение на поръчката;**

*I. Организационна структура и технологии за извършване на дейността. Координация с останалите участници. Вътрешен контрол.*

*Техническата и технологичната организация и подход за изпълнение за правилното протичане на дейностите по проекта включват:*

✓ осигуряване на актуална технологична документация – одобрен технологичен план за дейностите, зададени от представител на Инвеститора;





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- ✓ осигуряване на допълнителни регулиращи документи, инструкции и данни – маршрутни графици, сертификати, възлагателни писма, приемателни протоколи, заповеди за премахване и др.;
- ✓ осигуряване на изправна механизация и съоръжения – техниката ще е преминала през необходимите прегледи и ще е в състояние за безопасна употреба;
- ✓ осигуряване на човешки ресурси – наличието на подготвени кадри, запознати с целите и дейностите на поръчката;
- ✓ осигуряване на материали – влаганите материали /пр.: фиданки от местни дървесни и храстови видове /ще са качествени и ще притежават съответните сертификати;
- ✓ осигуряване на инструментална екипировка, като: подобрения меч на Колесов; мотики, кирки, брадви, лозарски ножици, сандъчета за пренасяне на фиданки, садилни колчета и др.;
- ✓ осигуряване на ефикасна работна среда – необходимо е да се работи при подходяща работна среда /пример: при много топло или студено време ще се ограничат дейностите/, безопасна за здравето на работниците, като им се осигуряват необходимите материали и инструменти.

Ние имаме изградена диференцирана йерархична организационна структура.

Стопанската дейност на фирмата се ръководи от управителя на фирмата. Той организира и координира дейността на административно-финансовия и производствено-техническият отдел, имащи отношение към дейностите по договора.

Управителят планира основните дейности, съобразно тези в договора и изготвя стратегия и дългосрочен план за развитие съвместно с ръководителите на отдели и звена, ангажирани към тази поръчка, а именно: инженер лесовъда и бригадира. Те от своя страна свеждат до знанието на работниците какви дейности ще се извършват.

Ръководителят на организацията ни делегира права на инженер лесовъда и бригадира на конкретни обекти да изпълняват точно определени дейности - т.е. те изпълняват функции на оперативен мениджмънт.

Изпълнителят се ангажира да спазва изискванията по договорите за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Закона за обществените поръчки, както следва:

- ще осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително ще съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, ще осигури достъп до обекта и цялата документация;
- ще изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
- ще докладва за възникнали нередности;
- ще информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на поръчката и за предприетите мерки за тяхното решаване;
- ще спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;
- ще спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта;





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

При необходимост дейностите ще бъдат коригирани или променени, ние ще очакваме това да става с възлагателни писма от инвеститора. Управителят планира основните дейности, съобразно тези в договора и изготвя стратегия и дългосрочен план за развитие съвместно с ръководителите на отдели и звена, ангажирани към тази поръчка, а именно: инженер лесовъда и бригадира. Те от своя страна свеждат до знанието на работниците какви дейности ще се извършват.

Фокусът на изпълнението на проектите ще се насочи към разбивка на задачите, разпределението на конкретните задачи на отделните участници и изпълнители, ръководството и контролът по време на реализацията, и накрая интегрирането на отделните части в завършен цялостен проект.

Съответстващите технически умения и наличието на ресурси са необходими, но не са достатъчни за гарантиране на успеха на даден проект. Необходима е координирана екипна работа и ръководство, които са същността на успешното ръководство на един проект.

Ръководството осигурява и отговаря за разпространението и обmena на информация при осъществяване въздействие върху изпълнението при възникването на риска. По този начин се стимулира постоянното подобряване на качествено управление на възникналия риск.

Взаимният контрол, обратна връзка, проследимост за спазване на правата и задълженията на служителите и оценка на тяхната работа се осъществява в оперативен порядък, чрез провеждане на оперативни заседания за възникналия риск, решенията от които се протоколират в свободна форма. На тези заседания се обсъждат и се вземат решения по текущите рискове и се набелязват конкретни задачи, отговорници и срокове за изпълнение на поръчките. Решенията, записани в протокола, имат силата на заповед на Управителя. Те се свеждат до знанието на работниците по звена. Техните отговорници следят за навременното и качествено отстраняване на възникналите рискове. Отклоненията от технологичната последователност на видовете работа се коригират своевременно. Управителят следи инженер- лесовъда и бригадира да спазват изпълнението на дейностите, предвидени на оперативките. Той следи и контролира дейностите, предвидени в договора, да се извършват качествено и в срок.

Предложения, запитвания, молби и други се предават от служителите на Управителя. Информация относно внесени изменения, както и нареждания за изпълнение на определени специфични задачи от служителите, се оповестява чрез писмени заповеди на Управителя.

Контролът върху изпълнението на договора и контролът на риска ще се осъществява от инженер лесовъда съвместно с инвеститори, представители на администрацията на парка. Те ще следят изпълнението на договора, ще дават насоки и препоръки за корекция в действията на екипите по изпълнението на дейностите. Това също дава устойчивост на дейностите през периода на тяхното осъществяване. Така ще бъде отразен напредъка по възложените дейности и направления.

- Организация на дейността





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/2.06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Управителят, инженер- лесовъдът и бригадирът съвместно координират цялата дейност по започването, изпълнението и предаването на обектите. Структурират и организират задачите и механизацията, като ги разпределят по звена. Дейностите за извършване са предварително зададени от представител на Инвеститора.

#### • Инструктаж при начало на етап

Преди започване на дейностите ръководителят на екипа и техническите лица, отговорни за обектите, провеждат инструктаж на работниците от бригадите. При това се изхожда от принципа, че колкото по-добре работниците са запознати с това, което ще се извърши, толкова повече време и проблеми ще се спестят в периода на самото изпълнение. Обясняват им се технологичната последователност на етапите на изпълнение. Разпределя се и механизацията, техниката и материалите за съответната дейност. Работниците преминават и през инструктаж за безопасност на труда.

#### • Оперативен контрол на процесите

Инженер- лесовъдът и бригадирът извършват постоянни проверки за качеството и начина на изпълнение, за спазването на дейностите и всички условия по поставените задачи. Проследяването на изпълнението на договора се извършва, чрез документиране на изпълнените етапи или задължения по договора. При наличие на несъответствие, организацията ни го описва и предписва мерки за отстраняването му. Инженер лесовъда, осъществява непрекъснат контрол върху дейността и работата на работниците.

За изпълнението на дейностите Възложителят извършва постоянен контрол на изпълнението на договора. Той е в постоянна координация с Изпълнителя.

#### • Предаване на обект

Предаването на обекта на Възложителя става след окончателното приключване на изпълнението на задачите, съгласно договора и се приключва с подписването на документи за окончателно завършване. Влаганата растителност се доказват с фактура или складова разписка.

Комуникацията, като обмен на информация между участника в настоящата процедура и Възложителя и участникът и трети лица, участващи в реализацията на проекта, ще се извършва на база предложената обща организационна структура. За да протече качествено и в срок изпълнението на проекта ръководството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ясно ще покаже управленските си функции при изпълнението на тези инфраструктурни проекти като Възложител по същите.

За изпълнението на проекта ще създадем екипи. Веднъж създадени и формирани, екипите ще се управляват успешно. Ще приложим познанията на екипа си, но ако се появи съмнение за неефективно изпълнение, ще се наложи коригирането на небалансирания екип. За целта може ще бъде приложена комбинация от два или повече от следните подходи:

- Разместване – размяна на дейностите, извършвани от членовете на екипа.
- Увеличаване гъвкавостта на функциите на екипа – за всеки член на екипа се проучва кои задачи изпълнява с най-голямо удоволствие и с кои се справя най-добре – на тази основа се разпределят задачите и отговорностите.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Понякога може ще се окаже, че даден член има желание да изпълни задачата, но му липсва компетентност – в такъв случай ще се подходи дипломатично.

- Разделяне членовете на екипа, които не се разбират помежду си – екипът може да се раздели на по-малки групи, които ще отговарят за различни части на проекта. При провеждане на групови срещи ще има някой миротворец като съекипник или координатор.
- Набиране на нови членове – ако е необходима нова роля и имаме възможност (ресурси) ще я осигурим.

В този контекст на качества, умения и роли на инженер лесовъда и бригадира е важно да се подчертае необходимостта те да ги формират и развиват, за да управляват по - успешно екипите. За да формират екипна компетентност, ръководителите на екипите, отговарящи за реализирането на поръчката, ще предприемат целенасочени действия.

### **Възможности за възникване на комуникационни проблеми**

Такива проблеми могат да възникват в редица случаи.

- 1) Различия в компетентността на лицата, които комуникират.
- 2) Избирателно възприемане
- 3) Достоверност на източниците

### **Усъвършенстване на комуникацията**

Нашето дружество ще създаде организация за линеен метод на комуникация, който ще включва следните управленски решения:

- 1) Следене дали информацията се приемат и интерпретират правилно в групите
- 2) Регулиране на информационния поток – ще се осигурява оптимизиране на приток на информация към Възложителя. Информацията ще бъде синтезирана, така че проблемът ще е в състояние да се реши най-бързо и ефективно.

### **Вътрешен обмен на информацията**

Вътрешният обмен на информацията се извършва на основата на Организационната структура.

Комуникацията между отделните равнища е двупосочна, като служителите от всяко равнище непосредствено контактуват с най-близкото по-горно и по-долно равнище. При необходимост са възможни случаи на комуникация и на други равнища.

Предварително планиране на необходимите ресурси – човешки и материални, е осигурено при подаването на документите на ключовите експерти, заложили в минималните изисквания към кандидата в настоящата обществена поръчка, на които отговаря участника.

Проектът ще се ръководи от необходимите квалифицирани кадри, които ще отговарят за навременното и качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя, спазването на изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа на Възложителя. Те ще отговарят и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица (когато това се изисква по закон). Ще има технически ръководители, които ще ръководят отделните подобекти.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

За улесняване на комуникацията между различните екипи по проекта, ще има назначен координатор на проекта и специалистите от различните екипи ще бъдат в непрекъсната връзка помежду си.

Съвещания на ръководството – провеждат се между управителя и ръководители или между ръководители и техните служители. Разглеждат се проблеми като:

- ресурси;
- проблеми, планове, оперативни задачи и тяхното изпълнение;
- провеждане на разяснителна работа за формиране на съзнание у персонала за важността от непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите;
- несъответствия при осъществяване на договорните изисквания, срокове и др.;
- персонал – нови назначения, въпроси от персонално естество (заплащане, сигурност, процедури) и др.

Писмената комуникация се осъществява, чрез следните форми:

- заповеди;
- планове и отчети;
- рапорти;
- докладни записки;
- входяща и изходяща кореспонденция;
- трансфер на данни по електронен път;
- резолюции, справки, мнения и др.;

### **Ефективност на организацията на работа**

Предложената организация на работа ще постигне ефективно изпълнение на поръчката чрез ефективност на изпълнението, контрола и приключването на процеса.

➤ **Изпълнение** – Ще се координират усилията на хората и използването на ресурсите. Ще се наблегне на подобряване на взаимодействието между членовете на изпълнителския екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта. Също така за постигане на качествено изпълнение ще се разпространи навреме необходимата информация до всички участници в проекта, ще се идентифицират промените и ще се осигури, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

➤ **Контролиране** - процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни (излизащи извън допустимите граници, заложи в плана) и налагат промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по проектите включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:

-Отчитане на изпълнението – изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие;





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

-Интегриран контрол на промени – координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта;

-Контрол на качеството – проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, и идентифициране на пътища за елиминирание на причините за незадоволително изпълнение;

-Контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и избягване на риска.

Ръководството е отговорно за правилното функциониране на системата, съвкупност на права, задължения и взаимодействие между различните членове на екипа и екипите, планирането, трудоустroяването, обработване, подготовка, преглед, сключване и контрол за изпълнението на изискванията и очакванията на Възложителя.

Поради тази причина организацията на дейността на фирмата ще се основава на елементите за отговорност и отчетност, компетентност, документация и комуникация. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнение на политиката. Ще се прилагат принципите за извършване на дейността, заложен в нормативните актове, националните указания и доказалите своята ефективност форми на „добра практика“.

#### **Осигуряване на ресурси**

Цел на тази точка е определянето на необходимите ресурси за качественото изпълнение на задачата, предмет на настоящата обществена поръчка, ръководството на фирмата планира и осигурява ежедневно необходимите ресурси за повишаване удовлетвореността на Възложителя, чрез изпълнение на неговите изискванията.


Това са:

- **човешки ресурси** – квалифицирани и компетентни експерти, знаещи и можещи ще изпълняват с високо качество всички дейности, необходими за извеждане на поръчката до успешен край, в зависимост от изискванията на Възложителя;
- **инфраструктура** – работни помещения, оборудване, средства за транспорт и комуникация, осигуряващи подходящи условия за работа на експертните екипи;
- **работна среда** – осигуряваща възможност за изпълнение на дейността на персонала и за нормално функциониране на оборудването, с цел постигане съответствие с изискванията към изискваните услуги;
- **информация** – интелектуална собственост, система и средства за комуникация и други данни, използвани като източници за получаване на информация и непрекъснато развитие на професионалната информираност на специалистите на дружеството.

#### **Технически преимущества допринасящи за реализацията на проекта:**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG16IPO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

✓ Организацията ни разполага с машинен парк, дърводелска работилница, цех за метални заготовки, бензиностанция, разположени на 30 дка. и др. Имаме техника с различни габарити и мощности, необходима за изпълнението на дейностите ни по проекта, като и специализирана такава. Това ни позволява да реагираме на промени, настъпили в процеса на дейностите, изисквани от Възложителя. Предвиждаме да използваме механизирани техника като: верижни трактори, машина за вадене на пънове, автоцистерна, самосвал и др.

✓ Работниците в организацията ни са квалифицирани за дейността, която ще извършват, като ние постоянно инвестираме в професионалното им обучение. Разполагаме с техническо звено състоящо се от: инженер лесовъд, техник озеленител, ландшафтен архитект, агроном и др.

✓ При нас работят 20 озеленители с квалификация „Работник озеленител“ трета степен. Имаме кадри, преминали обучение по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос: 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“, Основна област на интервенция: 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица“. Името на схемата е „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2“. Те са получили професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“. Тези от тях, които работят с моторни триони имат свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези.

✓ При приключването на обекта и приемането му със съответните нормативни документи в срок той ще бъде открит за ползване от посетителите на ПП Странджа. За да се проведат в срок дейностите ние имаме осигурена кредитна линия и можем сами да финансираме дейности и мероприятия, необходими за проекта преди отпуснатото авансово/междинно плащане.

✓ Организацията ни е разработила и внедрила Интегрирана Система за Управление /ИСУ/, състояща се от:

- ISO 9001:2008;
- ISO 14001:2004;
- OHSAS 18001;

✓ Опитът ни е доказал, че когато се прави залесяване е добре съществуващата растителност да се запази. Това смятаме да го осъществим за пръв път в България с използването на уред с томографски стрес - вълни. Томографските стрес - вълни са широко използван метод за инспекция на състоянието на дървото и неговата коренова система. Томографът за дървета е разработен диагностичен апарат за установяване на местоположението на корените на растителните видове по метода на стрес-вълните. От 2004 г. тези измервания се прилагат и са събрани интересни резултати за структурата на корените на различните семейства





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



Министерство на околната среда и водите  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

декоративна растителност. Този подход все повече се използват в озеленяването и лесовъдството за откриване на корени в близост до инфраструктура, където е необходимо да се прокопава канал, както и за полагане на кабели в близост до дървета или за реконструкцията на съществуващи паркове. Ние ще го приложим в поотдел № 150 "и", където иглолистната група от бял бор и кедри ще се запази.

✓ Доставка на всички материали, необходими за изпълнение на залесителните мероприятия в проекта ще бъдат вложени съобразно изработените проекти, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти. Всички материали, които ще бъдат употребени ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларации, удостоверяващи съответствието на всеки един от доставените материали със съществените изисквания към строежите, съгласно: Закон за защитените територии, Закон за горите, Наредба № 2 от 07.02.2013 година, за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използване за създаване на специални, защитни, и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране, Закон за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове към него.

✓ Ще подчертаем, че влагаме собствена растителност, отгледана в страната ни и климатизирана към метеорологичните условия. Това я прави устойчива на студ, прах, шум, топлина, UV лъчи и др. фактори, типични за този климатичен пояс. Растителността може и да е школувана, тоест преминала е през различни технологични етапи, и е годна за влагане. Контейнерното производство е произведено в нашите разсадници и оранжерии. Нашата продукция има Разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитания, апробация и семеконтрол /ИАСАС/ за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал от декоративни култури.

✓ При стартовия растеж на фиданките ще използваме препарати чрез обработването на кореновата система. Така процентът на прихванатата растителност очакваме да е над 95%, а не 80%, както е заложено в проекта.

✓ Предвиждаме по време на реконструкцията на обекта да го охраняваме до предаването му за експлоатация на парка. Така целим 24-часовото опазване на новосъздадените и вече съществуващи залесени площи от всякакви кражби, вандалски прояви, паша и посегателства върху тях от недобросъвестни граждани. Организацията ни разполага с Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №511/16.02.2005г. на основание чл.4 от Закона за частната охранителна дейност.

**Гарантирана устойчивост на резултатите и мултипликационен ефект**

Приносът и резултатите от нашата дейност предвиждаме да са:

- премахване на инвазивни видове и влагане на нови, отличаващи се с художествено-естетически, рекреационни и екологични качества;





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- постигане на високо качество на околната среда чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.
- проектът допринася за устойчивото развитие на парк Странджа и община Малко Търново;

Устойчивостта на изпълнението на договора се гарантира с факта, че изпълнителят притежава необходимият човешки и технически ресурс за изпълнението на основните направления на поръчката.

Продукцията ни е с доказани качества, за които многократно е печелила отличия от Изложба с международно участие "ФЛОРА" - Бургас.

Мултипликационният ефект ще се изрази и в създаването и ефективното функциониране на хоризонталните връзки между участниците в договора.

Успоредно с това подобряването на зелената среда на територията на парк Странджа и община Малко Търново ще окаже мултипликационен ефект върху местната и регионална икономика.

Дейностите по проекта ще повишат привлекателността на парка и общината. Така районът ще увеличи туристическата си стойност, а паркът има важно значение за модерната визия на жизнената среда.

Паралелно с това проектът ще окаже и мултипликационен ефект върху инвестициите в района. Повече инвестиции в тези райони означават повече работни места и увеличаване на доходите на местното население, и на общините на територията на Югоизточен район за планиране.

Изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или подкастрирането на дървета, пълнове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи растения и земни почви, се извършва съгласно предписание от експертна оценка, заложена в проектната документация.

## II. Обхват на дейността и методология за изпълнение на обществената поръчка.

### 1. Видове инвазивни култури и териториален обхват на дейността



Ще се извърши пряко унищожаване на дървесни и храстови инвазивни растения от видовете айлант и аморфа в пилотни райони по поречието на река Велека и нейните притоци, в следните поземлени имоти и подотдели от Държавни горски територии, с обща площ 71 дка. В иглолистните култури инвазивният вид храстовидна аморфа (*Amorpha fruticosa*) е залесена през 50-те години на

съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез проект за съдържанието се носи от ДГП "Странджа" и при гласява официалното становище на Европейския съюз и България, представявано от





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

миналия век по горските схеми за създаване на горски култури с главен дървесен вид, второстепенен вид и храсти. **Amorpha fruticosa** - храстовидна аморфа/-сем. **LEGUMINOSAE** - Бобови/

Храст с височина 3-6 м, с тънки, слабо разклонени стъбла. Цветовете са тъмно виолетови, дребни, събрани в гъсти, връхни, изправени и дълги гроздове. Цъфти през юни в продължение на около 3 седмици, а понякога и повторно през юли-август. Издържа както на засушавания, така и на продължителни заливания. образува изобилно коренови издънки. В България е разпространен предимно като парково растение, намира широко приложение при укрепване на земни насипи. Инвазивен вид, който е широко разпространен на територията на Поморийско езеро. Заема площ около 1250 кв. м.

**Ailanthus altissima** - обикновен айлант/-сем. **SIMAROUBACEAE** - Айлантови/

Дърво с височина 25-30 м, с рядко разклонена корона, съставена от дебели разклонения. Кората е гладка, при старите дървета слабо напукана и сивокафява. Листата са дълги, разположени последователно. Цветовете са зеленикавожълти, дребни и събрани в рехави, метличести съцветия. Цъфти през юни-юли. Плодовете се задържат върху дървото почти през цялата зима. Развива мощна коренова система, като образува голямо количество коренови издънки, които бързо заемат площта около майчиното растение. Произхода на този вид е от източна Азия. Добре адаптиран към нашия климат. Използва се предимно за укрепване на терени със сухи и бедни почви.

1.1. Подотдел № 150 "и" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година - горска култура от иглолистни видове с подлес от аморфа – 5 дка;

1.2. Подотдел № 155 "з" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – горска култура от черен бор с подлес от аморфа – 8 дка;

1.3. Подотдел № 156 "в" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – горска култура от иглолистни видове с подлес от аморфа – 8 дка;

1.4. Подотдел № 156 "д" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година горска култура от черен бор с подлес аморфа - 27 дка;

1.5. Подотдел № 163 "к" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година – дъбово издънково насаждение с подлес от аморфа – 5 дка – част от подотдела по брега на реката;

1.6. Подотдел № 169 "1" по ЛУП на ДГС Малко Търново от 2008 година - поляна, покрита с аморфа – 9 дка.

1.7. ПИ № 1004, землище на с. Звездец, м. Ковач – поляна, покрита с айлант 9 дка;

**2. Методология на изпълнение.**

За възстановяването на увредените местообитания по поречията на големите реки в Парка ще се осъществят следните мероприятия:

2.1. Изкореняване и механизирано или ръчно почистване на сечищата от дървесина, пълнове, дървесни и храстови отпадъци в подотдели № 150 "и", 163 "к", 169 "1" и ПИ № 1004.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

В подотдел № 150 "и" иглолистната група от бял бор и кедри ще се запази. Под склопа ще се отсеке и почисти аморфата и ще се извърши ръчна подготовка и залесяване.

В подотдел № 163 "к" ще се изкорени заетата с аморфа покрайбрежна част.

2.2. Пълна обработка на почвата на изкоренените площи на дълбочина до 50 см. В отделни участъци, където не е възможно механизизирано, подготовката на почвата и изкопаването на дупки ще се извършат ръчно.

2.3. В подотдели № 153 "з", 156 "в" и 156 "д" ще се отсеке и изкорени аморфата и други храсти под склопа и отпадъците ще се изнесат извън насаждението. Ще се извърши ръчна почвоподготовка в междуредията и свободните пространства.

*Подготовката на почвата/* Съгласно Чл.22. от Наредба №2 от 7.02.2013г/ за залесяване включва почистване на площта за залесяване. Това ние ще го извършим, чрез:

- изсичане на нежеланата растителност;
- окосяване на трева и папрат;
- премахване или събиране на отпадъците от сечта - по начин, посочен в технологичния план за залесяване.

*Измерване на площта* – това ще го направим за да установим границите и действителната площ.

*Маркиране на площта* – целта ни е да определим разположението на предвидените в технологичния план за залесяване вид почвоподготовка - пояси, тераси, площадки, дупки, канаво-валове, тераси - канавки, микропонижения и микроповишения.

*Обработка на почвата* – ще я направим, за да създадем благоприятни условия за развитие на растенията, влагозапасяване, отводняване, засаждане, отглеждане и инвентаризиране на културата.

Обработката на почвата ще я извършим предварително или в краен случай / пр.: при неблагоприятни климатични условия/ непосредствено преди засаждането на растенията по вид, начин, сезон и технология, посочени в технологичния план за залесяване /приложение №1 от Наредба №2 от 7.02.2013г и Чл. 23. от Наредба №2 от 7.02.2013г /

Вида обработка на почвата ще е пълна, където ще включим:

• почистване на площта и изораване - риголване - дълбока обработка на почвата, чрез изораване на дълбочина между 40 и 80 см., при която горният пласт се заравя дълбоко, а подорницата се изважда на повърхността. Извършва се ръчно - с лопата и с плугове;

• изкореняване или раздробяване на пълновете, премахване или събиране на изкоренените пълнове-/части от тях/, включително тяхното извозване извън площта при необходимост, подравняване, риголване или изораване;

• изораване преди засаждането, когато подготовката е извършена предварително.

Предвиждаме и пълната обработка на почвата да се прилага на равни и полегати терени и с дълбочина 25-100 см/в случая 50 см./Чл. 24. от Наредба №2 от 7.02.2013г /





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

При полегати терени пълната обработка ще се извършва по посока на хоризонталите, като при необходимост от противоерозионна защита ще се прокарат през 1-2 м. прекъснати /през 2-3 м/ водозадържащи бразди.

*Дървесните отпадъци, клони и храсти от инвазивни видове ще бъдат струпани на купчини и унищожени чрез изгаряне, там където се извършва изкореняване и пълна обработка на почвата (подотдели № № 150 "и", 163 "к", 169 "г" и ПИ № 1004.).*

2.4. Възстановяване на местообитанията чрез залесяване с местни растителни видове.

Почистените от инвазивни видове площи ще бъдат залесени с фиданки от местни дървесни и храстови видове в смесени съобщества (бяла върба, дъбове, дребнолистна и сребролистна липа, обикновена леска, горскоплодни и др.) – в различни схеми по предварително изготвен (от Изпълнителя) и одобрен технологичен план за залесяване (съгласуван от Възложителя), съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване. Основният дървесен вид ще бъде странджанският дъб – т.нар. лъжник/ *Quercus hartwissiana* /, а бялата върба, с която работим основно, е вкоренена. Технологичният план за залесяване представлява документ за планиране и извършване на залесяването, изготвен съгласно образец-/приложение №1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване/, в който се посочват конкретни данни за залесителния обект, мероприятията, които ще се извършат, количеството на посевния и посадъчния материал, видовете работа и работни операции;


*Залесяването с местни растителни видове ще се осъществи, чрез следните мероприятия:*

2.4.1. Доставка на пикирани и семенни фиданки с височина не по-малка от 0,40 м и не по-високи от 1,20 м., от сребролистна липа, дребнолистна липа, обикновена леска, дъбове и резници от бяла върба и др., достатъчни на брой за уплътняване на площите с не по-малко от 250 фиданки на декар, съобразени с условията на месторастенето.

Ще се доставят пикирани фиданки - семенни или вегетативни фиданки, произведени след презасаждане при по-рядка схема в отдела за пикиране в разсадника с цел по-бързо достигане на едри размери и балансирано развити коренова система и надземна част и семенни фиданки - фиданки произведени от семенен материал.

*Ще подчертаем, че влагаме собствена растителност, отгледана в страната ни и климатизирана към метеорологичните условия. Това я прави устойчива на студ, прах, шум, топлина, UV лъчи и др. фактори, типични за този климатичен пояс. Растителността може и да е школувана, тоест преминала е през различни технологични етапи, и е годна за влагане. Контейнерното производство е произведено в нашите разсадници и оранжерии. Нашата продукция има Разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитания, апробация и семеконтрол /ИАСАС/ за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал от декоративни култури.*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG16PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2.4.2. Подготовката на почвата за залесяване и отварянето на дупки, механизирано (с моторен свредел) и ръчно ще се извърши съгласно одобрен технологичен план.

Саденето ще се извърши в дупки, със садилни машини-моторен свредел или ръчно, където това не е възможно. Методът на залесяване се определя в зависимост от условията на месторастене, биологичните особености и екологичните изисквания на дървесните и храстовите видове и местната залесителна практика, като се преценя и икономическата целесъобразност. Посадните места се маркират непосредствено преди залесяването с подходящи маркери.

2.4.3. Засаждане в дупките на фиданки от видове - бяла върба, дъбове, дребнолистна и сребролистна липа, обикновена леска, горскоплодни и др.) с височина не по-малка от 40 см.

При засаждането ще спазим / Чл.28-глава шеста от Наредба №2 от 7.02.2013г /:

2.4.3.1. Фиданките ще са с открита коренова система:

- кореновата система на фиданките ще се предпазва от подсушаване и измръзване при транспортиране, съхранение и разнасяне до посадното място;
- няма да се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система и стъблото на фиданките;
- при пролетно засаждане кореновите шийки на фиданките ще се поставят на 2-3 см. под повърхността на почвата, а при есенно-зимно-на 3-5 см. под нея /не се предвижда в проекта/;
- за избягване на опасността от мразоизхвърляне на фиданките ще се прилага пролетно засаждане;
- фиданките след засаждането ще са здраво захванати за терена и при леко изтегляне няма да могат да бъдат изкоренени;
- при необходимост може да се прилага поливане на фиданките.

2.4.3.2. Фиданки със закрыта коренова система:

- минималният размер на посадното място ще съответства на размерите на кореновата система- /бала, контейнер/;

Засаждането ще се извършва при температура на почвата над 1°C, а фиданките ще са в растежен покой. Няма да се допуска залесяване на разкаляни, замръзвали и сухи почви. Допуска се използването на абсорбиращи влагата и подпомагащи стартовия растеж на фиданките препарати, чрез обработването на кореновата система или внасянето им в посадните места при засаждане. На силно дренирани с ниски подпочвени води площи може да се прилага дълбоко засаждане-0,60-3,0 м на фиданки и леторасли от тополи и върби.

Залесяването ще го / Чл.30-глава шеста от Наредба №2 от 7.02.2013г/ извършим през пролетта, като задължително фиданките ще са във вегетационен покой.

2.5. Последващи грижи за залесените площи (окопаване, окосяване, изсичане на издънки, мулчиране, поливане и др.), съгласно Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Тези грижи са с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на засадените дървесни и храстови видове в най-млада възраст, поддържането им в добро здравословно състояние, регулиране на състава на културата и създаване на условия за производство на висококачествена дървесина.

Отглеждането се осъществява по следните начини:

- 2.5.1. Обработка в редовете и междуредията – механизирано или ръчно/2-3 пъти/ според технологичния план.
- 2.5.2. Поливане и торене при необходимост
- 2.5.3. Окосяване и изсичане на издънки – при необходимост юли или август

Изпълнителят ще гарантира процентът на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 % след извършена инвентаризация на горските култури до 15.08.2015 година.

Инвентаризацията/ Чл.36. от Наредба №2 от 7.02.2013г/ на създадените горски култури ще се провежда за установяване на:

- 1. действителната залесена площ;
- 2. състоянието на културата;
- 3. процента на прихващане на фиданките по дървесни видове;
- 4. състава на културата;
- 5. необходимостта от попълване, презалесяване или отглеждане.

Инвентаризацията е задължителна и ще се проведе. Обхватът, органът, от който се извършва, определянето на действителната площ на създадените култури, методите по които се провежда и начинът, по който се отразяват и отчитат резултатите от нея са подробно описани в Наредба №2 от 7.02.2013 г.

2.6. Изработка и монтаж на 7 броя дървени табели, поставени във всеки експериментален участък( отдел, подотдел), направени по стандарт на парковата инфраструктура. Всяка табела ще съдържа информация за извършената дейност. Текстът на табелите ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя. Размер на табелите – 60 x 90 см.

Разполагаме с необходимата техника, екипировка и човешки ресурс за извършване на дейността. Ще извършим дейността качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със Закона за горите и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП (ЛУП), и актуална скица на ПИ № 1004, м. Ковач, земл. на с. Звездец, издадена от Общинска служба "Земеделие" – Малко Търново, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта ще се подпише протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

При извършване на дейността ще се спазят:

- 1. Закон за защитените територии.
- 2. Закон за горите.





Решения за

по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3. Наредба № 2 от 07.02.2013 година, за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използване за създаване на специални, защитни, и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

4. Закон за биологичното разнообразие.

5. Нормативната уредба по отношение безопасните условия на труда.

Дата: 30.12.2014

гр. Бургас

Подпис и печат: .....

/Васил Танев/  
(име и фамилия)



## ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФ

**Обект :** ' Възстановяване на увредени местообитания по поречията на го  
ограничаване разпространението на инвазивни растителни в

№	Наименование на СМР	Среден брой работници	Календарни дни
1	2	5	62
Обект : "Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове."			180
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи		
1	Изкореняване на пъни	8	10
2	Избутване на изкоренени пъни до 50 м.	8	5
3	Подравняване на площи след изкореняване	8	5
4	Риголване еднопосочно	8	5
5	Подравняване след риголване	8	5
6	Почистване на площи за залесяване – ръчно	8	5
7	Подготовка на почвата за залесяване – ръчно, дълбочина 35 см	8	10
8	Залесяване ( доставка и засаждане на фиданки, съгласно одобрен технологичен план)	8	35
9	Последващи грижи за залесените площи ( окопаване, окосяване, изсичане на издънки, мулчиране, поливане и др.)	8	110
10	Изработване и монтаж на табели - 60 x 90 см	8	3

\* Крайна дата на изпълнение на поръчката-15.08.2015 г-с прихващане на едногодишните горски култури мин 80%  
Дата: ...3...12.2014 г.


88



С ХОРИЗОНТАЛНИ ДИАГРАМИ

*[Handwritten signature]*

те реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез  
(айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове.'

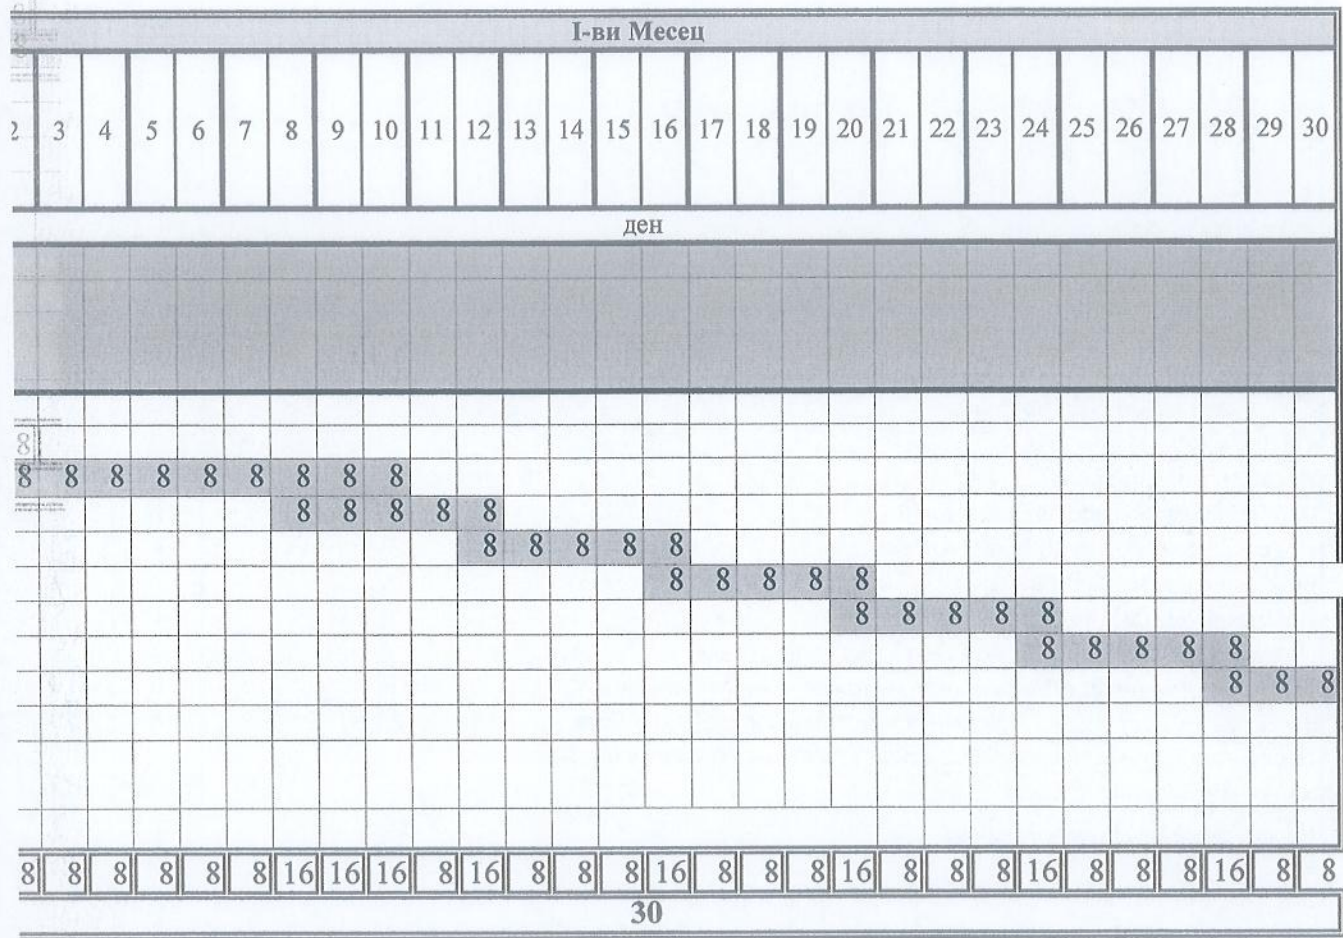

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



[illegible]



*[Handwritten signature]*

III-ти Месец																													
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ден																													
<i>[Shaded area]</i>																													
8																													
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																				
										8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
30																													

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



[illegible]








[illegible]



18

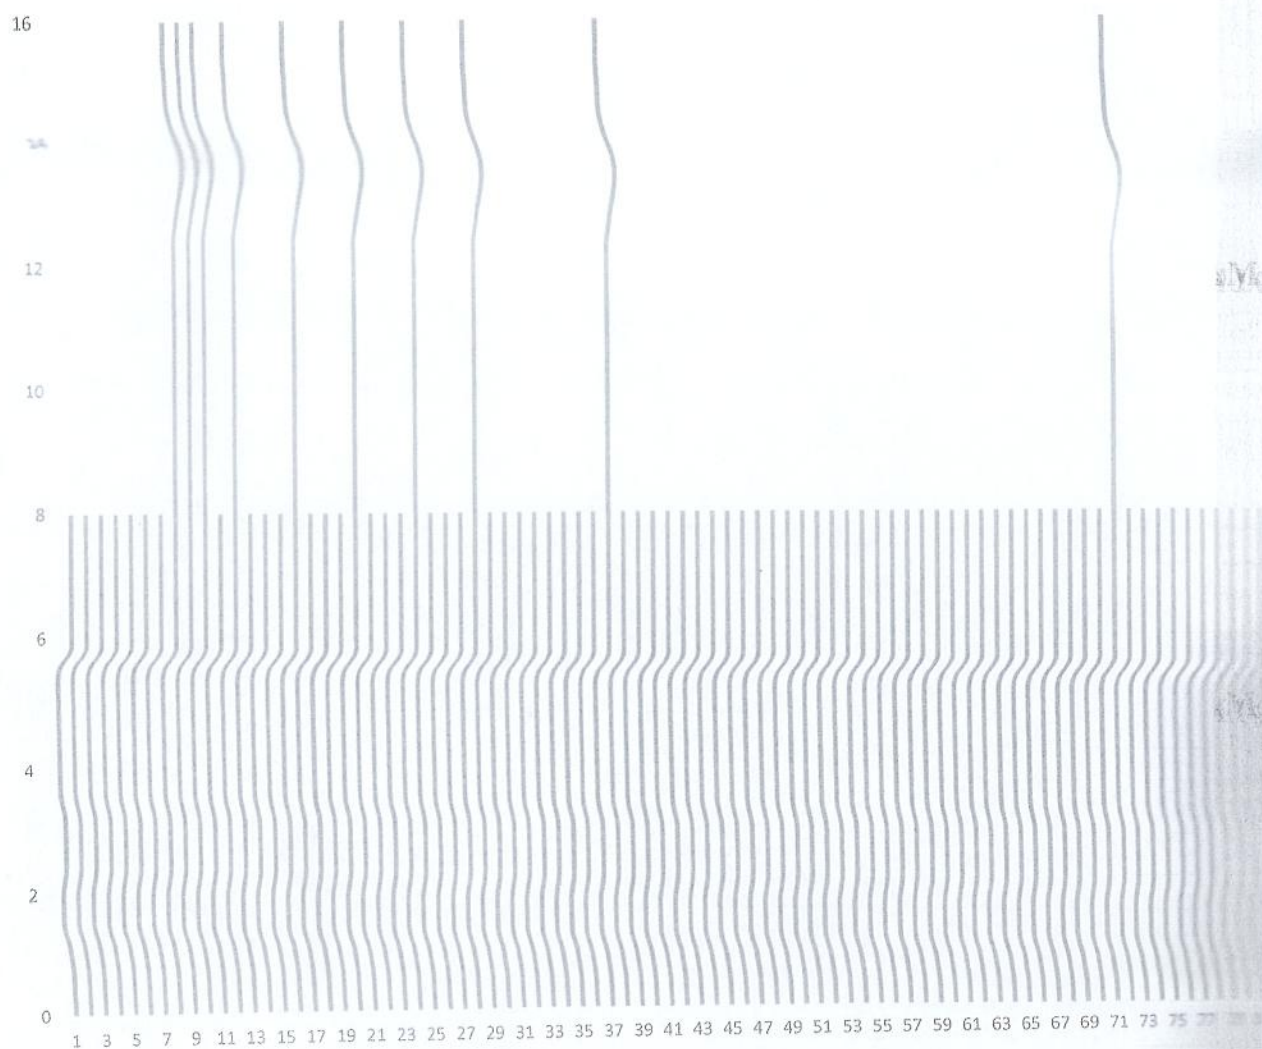


100



ОТНАТА РЪКА

17/11

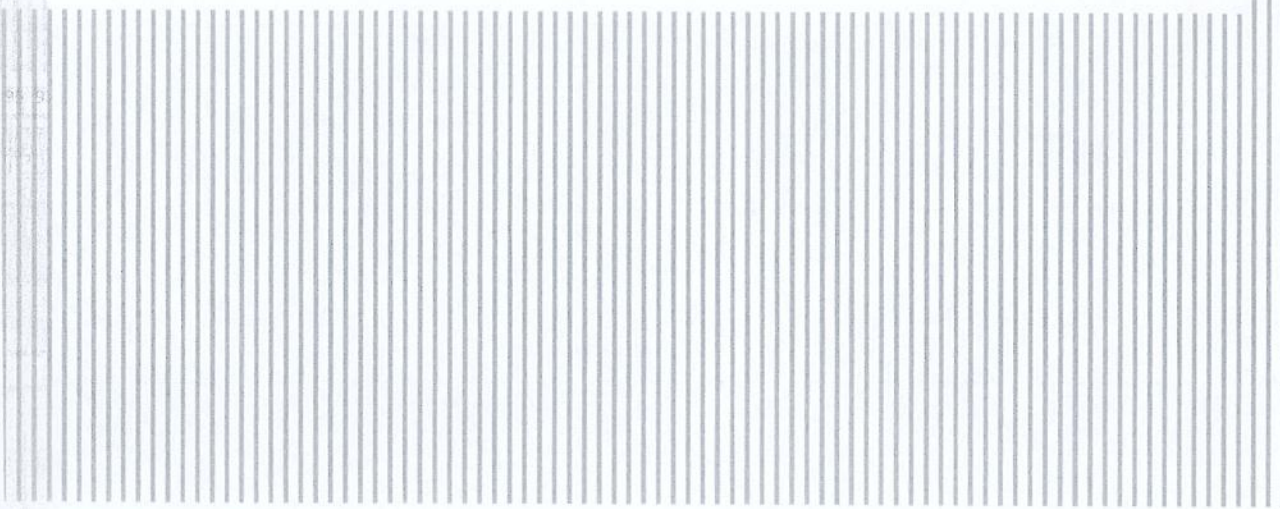

95 97 99 101103105107109111113115117119121123125127129131133135137139141143145147149151153155157159161163165167169171173175177179

Дата: 30.12.2014 г.



Handwritten signature in blue ink.

Two handwritten signatures in blue ink.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moew.government.bg/>



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове",

ДО

Образец № 13

ДПП „СТРАНДЖА“  
гр. МАЛКО ТЪРНОВО  
ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ № 1

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

« Бургасцвет-90-Танев » ЕООД

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа) и залесяване с местни растителни видове.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

**Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):**

**87 460 / осемдесет и седем хиляди четиристотин и шестдесет / лева**

(цифром и словом, в лева без ДДС)

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

**Предложената цена е сбор от единичните цени на услугите, предмет на поръчката, както следва:**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове",

№	Дейност/Услуга	Количество, мярка	Единична цена	Обща сума в лв. без ДДС
1.	Изкореняване на пъни	24 дка	120	2880
2.	Избутване на изкоренени пъни до 50 м.	24 дка	120	2880
3.	Подравняване на площи след изкореняване	24 дка	120	2880
4.	Риголване еднопосочно	24 дка	300	7200
5.	Подравняване след риголване	24 дка	80	1920
6.	Почистване на площи за залесяване – ръчно	47 дка	300	14100
7.	Подготовка на почвата за залесяване – ръчно, дълбочина 35 см	47 дка	300	14100
8.	Залесяване ( доставка и засаждане на фиданки, съгласно одобрен технологичен план)	71 дка	300	21300
9.	Последващи грижи за залесените площи ( окопаване, окосяване, изсичане на издънки, мулчиране, поливане и др.)	71 дка	250	17750
10.	Изработване и монтаж на табели - 60 x 90 см	7 бр.	350	2450

Дата: 18.12. 2014 г.

Участник: „ Бургасцвет-90-Танев“ ЕООД  
Управител: Васил Танев

(Длъжност, фамилия, подпис и печат)
